

Overview Serviços - LE

» Ramon Cintas Gomes

2026 / Fevereiro



Índice



- ◆ **Fases da Metodologia de Projetos**
- ◆ **MIT041 - Diagrama dos processos**
- ◆ **MIT044 - Especificação da Customização**
- ◆ **MIT045 - Roteiro de Testes**
- ◆ **MIT010 - Termo de Validação**
- ◆ **MIT031 - Solicitação de Mudança**
- ◆ **MIT006 - Lista de Retrospectiva e Pendências**
- ◆ **Fluxo das MITs**
- ◆ **Boas Práticas ADVPL**
- ◆ **Modo Overclock Ativado**





Fases da Metodologia de Projetos



- ❖ A metodologia é composta pelo Ciclo de Venda e 4 fases de entrega com entregáveis e atividades específicas
- ❖ Cada fase termina em um Quality Gate (Controle de Qualidade) para verificar a completude dos entregáveis



Fases da Metodologia de Projetos



Ciclo de Venda

- ☐ Validação Interna da Proposta
- ☐ Abertura de Contratos e Projetos
- ☐ Onboarding

1 FASE Preparação



Alinhamentos iniciais, avaliação e definição do planejamento e elaboração dos planos do projeto.

- ☐ Passagem de bastão
- ☐ Abordagem inicial
- ☐ Aspectos técnicos
- ☐ Planos do projeto, cronograma e custos
- ☐ Boas vindas do projeto
- ☐ Encerramento da fase e avaliação de *Quality Gate*

2 FASE Refinamento



Entendimento do negócio do cliente e disseminação da abordagem do trabalho e quais entregas serão realizadas de acordo com o proposto no projeto

- ☐ Execução, monitoramento e controle
- ☐ Análise e desenho de processo e configuração
- ☐ Protótipo e validação
- ☐ Definição da estratégia de testes
- ☐ Preparação da capacitação
- ☐ Definição da conversão de dados e interfaces
- ☐ *Backlog* do projeto e planejamento das *Sprints* e *Releases*
- ☐ Encerramento da fase e avaliação de *Quality Gate*

3 FASE Realização



Realizações de *Sprints*, focados em resultados rápidos e com percepção de evolução constante, gerando valor a todos os envolvidos no projeto.

- ☐ Execução, monitoramento e controle
- ☐ *Sprints* e *Releases*
- ☐ Capacitações
- ☐ Cargas de dados
- ☐ Preparação e execução das simulações
- ☐ Plano de Transição
- ☐ Encerramento da fase e avaliação de *Quality Gate*

4 FASE Operação



Acompanhamento da experiência e valor gerado, garantindo que o projeto seja finalizado com qualidade e insumos positivos para novos projetos do cliente

- ☐ Execução, monitoramento e controle
- ☐ Transição
- ☐ Operação Assistida
- ☐ Transição, retrospectiva, encerramento e avaliação de *Quality Gate*



MIT041



Diagrama dos processos

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT041	Diagrama dos Processos	Documento modelo para levantamento e registro dos processos e regras de negócio do cliente, fluxogramas, critérios de aceitação e registro dos Gaps encontrados. Um processo de organização estrutural do início da documentação para start de implantação do cliente	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim	
MIT041	Escopo de Negócios	Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável	
MIT041	Escopo Técnico	Documento utilizado quando possui customização para mapear as particularidades do produto SFA	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável	



MIT044



Especificação da Customização

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT044	Especificação da Customização	Documento modelo para levantamento, registro e encomenda das customizações a serem desenvolvidas	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável	



MIT045



Roteiro de Testes

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT045	Roteiro de Testes - Simplificado	Registro e gestão das atividades/cenários para realização dos testes em projetos de baixa complexidade ou exclusivamente para testes unitários.	Todos	N/A	Sim	
MIT045	Roteiro de Testes - Completo	Registro e gestão das atividades para realização dos testes em projetos de média e alta complexidade e para uso em testes integrados.	Todos	N/A	Sim	



MIT010

Termo de Validação

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT010	Termo de Validação (Marco/Entrega, Homologação, Go-live e Suspensão)	Modelo de documento para formalização com o cliente das seguintes etapas: Homologação, Autorização para Go Live, Validação de Entrega / Marco ou Suspensão de Projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim	
MIT010	Termo de Execução do Piloto - TOTVS CRM	Template para formalizar a execução do piloto. O que foi realizado, se foi encontrado alguma inconsistência nessa etapa. Acompanhamento da execução real do sistema. Cliente assina /valida a execução do piloto.	TOTVS CRM	Assinatura eletrônica ou física	Sim	



MIT031



Solicitação de Mudança

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT031	Solicitação de Mudança	Modelo de documento para formalização com o cliente sobre mudança no escopo do projeto.	Todos	Assinatura eletrônica ou física	Sim, quando aplicável	



MIT006



Lista de Retrospectiva e Pendências

Código	Nome do Template	Objetivo	Produto	Forma de Aceite	Obrigatório?	Saiba mais
MIT006	Lista de Retrospectiva e Pendências	Modelo de lista para registro e gestão das pendências e retrospectivas do projeto	Todos	N/A	Não	



Análise e Desenho de Processo e Configuração



2.1.1 Workshop de Avaliação dos Processos [Acessar Detalhes](#)

É fundamental conhecer os processos do cliente de acordo com o escopo do projeto para poder desenhar a solução pensando nas mudanças que poderão ocorrer.

Esta é uma etapa em que serão necessárias a condução de alguns workshops e entrevistas e é imprescindível que isso ocorra de forma direcionada ao que foi contratado para não gerar frustrações aos nossos clientes.

DICA 1: Enviar o material de apoio para levantamento (questionários) antecipadamente para orientar o usuário-chave e prepará-lo melhor para o momento da reunião de levantamento.

DICA 2: Solicitar antecipadamente cópias de modelos como relatórios, notas fiscais e qualquer documento que possa auxiliar o entendimento dos processos.

Descrição das atividades:

Analista / Especialista:

- Avalia o escopo do projeto para direcionar as entrevistas, alinhando as expectativas durante as mesmas
- Realiza workshops com os usuários-chave do Cliente para entender os processos atuais, formulários e relatórios utilizados no mesmo
- Analista/Especialista deve criar os fluxos dos processos para projetos que contemplem a elaboração de um fluxo
- É responsável por validar e coletar as assinaturas para formalizar o desenho elaborado
- **NOTA:** Analista / Especialista deve deixar o Gerente ou Coordenador do Projeto sempre alinhado com a condução e status da validação
- **DICA 1:** As melhores práticas indicam que a validação conjunta dos processos facilita o entendimento e assinatura do Diagrama dos Processos.
- **DICA 2:** Realizar um *double-check* do entendimento com os usuários-chave (confirmação da comunicação)



Análise e Desenho de Processo e Configuração



ENTRADA(S):

- Proposta Comercial assinada
- [Diagrama dos Processos - MIT041](#) preenchido
- Material de apoio para levantamento (questionário)



ATORES:

TOTVS

- Analista / Especialista*
- Gerente ou Coordenador do Projeto*

CLIENTE

- Coordenador ou Comitê do Projeto*
- Usuários-Chave*



SAÍDA(S):

- [Diagrama dos Processos - MIT041](#), determinando o desenho da solução, elaborados.
- Direcionamento para o [Plano de Configuração - MIT043](#).
- [Solicitação de Mudança - MIT031](#), caso necessário.

*Obrigatório



Análise e Desenho de Processo e Configuração



2.1.2 Desenho de Processos e Configuração [Acessar Detalhes](#)

Basicamente, o desenho da solução consiste em demonstrar ao nosso Cliente que entendemos o contexto de negócio definido pelos usuários-chave e que estamos aptos a configurar adequadamente o sistema ao uso, atendendo às expectativas gerais apresentadas.

Entretanto, se mesmo assim surgirem questões desta ordem (fora do escopo), o Analista / Especialista deve formalizar os *gaps* identificados através [Solicitação de Mudança - MIT031](#), propor em conjunto com o Arquiteto e o Comitê do Projeto a melhor abordagem dos assuntos e oferecerem alternativas para os cenários.

É muito importante ter o engajamento e responsabilidade dos usuários-chave na definição da solução.

- **NOTA:** O papel do Analista / Especialista neste contexto é trazer sua experiência de outros projetos e contribuir com *benchmark* nos processos, mas a responsabilidade de definição deve ser do usuário-chave (Cliente).

Descrição das atividades:

- Analista / Especialista elabora o fluxo operacional de acordo com as definições dos usuários-chave, seguindo o escopo acordado com o Cliente e identificando os pontos de desvio para a análise de *gaps*.
- Usuário-chave valida o fluxo e o descritivo
- Analista / Especialista descreve detalhes relacionados ao fluxo conforme necessidade de clareza:
 - Determinando regras de negócio
 - Descrevendo raciais de cálculo
 - Determinando critérios de entrada
 - Determinando critérios de saída
 - Identificando os resultados esperados
 - Identificando as configurações sistêmicas (Plano de Configuração - Parametrização do Sistema)
- Analista / Especialista deve validar e ter aprovação do cliente no [Diagrama dos Processos - MIT041](#) com os respectivos Usuários-Chave, determinando desta forma a solução a ser construída
- Gerente ou Coordenador do Projeto deve consolidar todos os [Diagramas dos Processos - MIT041](#) aprovados, como registro do Projeto
- **NOTA:** Este evento pode ser observado como um importante Marco do Projeto.



Análise e Desenho de Processo e Configuração



ENTRADA(S):

- Proposta Comercial assinada
- [Diagrama dos Processos - MIT041](#) preenchido
- Material de apoio para levantamento (questionário)



ATORES:

TOTVS

- Analista / Especialista*
- Gerente ou Coordenador do Projeto*

CLIENTE

- Coordenador ou Comitê do Projeto*
- Usuários-Chave*



SAÍDA(S):

- [Diagrama dos Processos - MIT041](#), determinando o desenho da solução, elaborados.
- Direcionamento para o [Plano de Configuração - MIT043](#).
- [Solicitação de Mudança - MIT031](#), caso necessário.

* Obrigatório



Especificação de Personalização (Desenvolvimento/Spec)



3.1.2 Encomendar / Desenvolver Customizações ▾ [Acessar Detalhes](#)

Customizações / Personalizações devem ter um cuidado especial, pois podem afetar tanto o plano do projeto, como o funcionamento adequado do sistema, considerando o desenho da solução.

Para mitigar estes riscos, os usuários-chave envolvidos devem estar acessíveis a utilizar rotinas padrões o máximo possível, assim como os analistas/especialistas estarem aptos a entender as necessidades e apresentar alternativas coerentes com o negócio e operação do Cliente.

Ao identificar uma necessidade de customização, o Analista / Especialista deve elaborar a Especificação da Customização informando detalhes importantes para aumentar a qualidade de entrega.

O desenvolvimento das customizações deve seguir o combinado e aprovado pelo Cliente, ou seja, seguir o que foi definido no [Diagrama dos Processos MIT041](#) e/ou [Especificação da Customização - MIT044](#)

Descrição das atividades:

- Analista / Especialista e Usuários-Chave (Cliente) avaliam os detalhes das necessidades de customizações, respeitando o escopo do projeto aprovado no Desenho da Solução (TO BE) e resultados da Análise de GAPS
- Analista / Especialista descreve os detalhes funcionais na Especificação da Customização para encaminhamento / solicitação do desenvolvimento ao time da Fábrica de Software ou do próprio time de desenvolvedores do projeto
- Líder Técnico da Fábrica de Software / Desenvolvedor do projeto avalia as solicitações e valida seu entendimento com o Analista / Especialista responsável pela encomenda.
- Líder Técnico organiza as entregas com o time de desenvolvimento (*Backlog / Sprints / Deploy*)
- Time da Fábrica realiza o desenvolvimento de acordo com o que foi definido no [Diagrama dos Processos MIT041](#) ou [Especificação da Customização - MIT044](#) e no Projeto Lógico (PL)
- Líder Técnico da Fábrica de Software:
 - Reporta avanço, riscos / *issues* encontrados, eventuais atrasos e desvios ocorridos
 - Envia as evidências de teste realizado, demonstrando o resultado positivo.
- Gerente ou Coordenador do Projeto acompanha a evolução e trabalha na comunicação e alinhamento com o Comitê do Projeto / Cliente.



Especificação de Processos (To-Be)



Processo *AS IS*

O objetivo da modelagem *AS IS* é obter uma formalização sobre como o fluxo do processo de negócio é realizado na situação atual em que é executado na organização. Serve como base para demonstrar as mudanças e impactos inerentes destas de forma visual ao Cliente.

- **DICA:** Não é recomendável investir muito tempo (e dinheiro) nesta etapa, pois o foco é no redesenho dos processos como base da solução.

Fonte: iProcess

Processo *TO BE* (*blueprint*)

É uma evolução do modelo anterior (*AS IS*), no qual são reavaliadas as questões de negócio envolvidas buscando-se, através de melhorias culturais e organizacionais, maior eficiência na execução do processo. Também devem ser aplicadas, para nosso propósito (ERP), a modelagem técnica visando evidenciar as mudanças com a aquisição do software ERP.

Fonte: iProcess



GAP Analysis

GAP Analysis

Análise de *GAPs* (*GAP Analysis* em inglês) é uma análise para determinar a diferença entre o ponto atual e o desejado, determinando qual o próximo passo/ação em um projeto ou em melhorar o processo de alguma tarefa; fazer como deveria ser. Também pode ser utilizada para identificar pontos fora do escopo negociado.

Fonte: Dynamics Community.

Quality Gates

Quality Gates

Deve ser entendido como um momento do projeto onde será feita uma avaliação detalhada de seu andamento e a determinação dos próximos passos a serem seguidos. Neste sentido, é importante que sejam estabelecidos em momentos onde seja possível ao gerente do projeto, juntamente com sua equipe, tomar ações que possam garantir que o projeto seja concluído com êxito.



• Entrada | Desenvolvimento | Saída



ENTRADA(S):

- Diagrama dos processos - MIT041
- Especificação da Customização - MIT044
- Projeto Lógico aprovado (PL)



ATORES:

TOTVS

- Desenvolvedor (Fábrica de Software)*
- Líder Técnico (Fábrica de Software)*
- Analista / Consultor de Implantação*
- Gerente ou Coordenador do Projeto*

CLIENTE

- Coordenador ou Comitê do Projeto*



SAÍDA(S):

- Customizações desenvolvidas.

** Obrigatório*



MIT045



Roteiro de Testes



2.3.1 Definir Ciclos e Cenários de Testes [Acessar Detalhes](#)

O Roteiro de Testes - MIT045 tem o importante papel de orientar os usuários responsáveis pelos testes a simularem todos os processos e seus respectivos cenários variados para garantir que a solução construída realmente atenda aos requisitos e expectativas gerais.

É também um bom momento para reafirmar o compromisso com os usuários-chave sobre seu papel de responsáveis pela qualidade dos testes e garantir que estão validando a entrega de um sistema que será usado no dia-a-dia deles.

- **NOTA:** Alguns clientes ainda solicitam executar esta etapa de validação em paralelo às tarefas diárias em um determinado período. É importante destacar que o roteiro estruturado é uma melhor opção, uma vez que o período de teste paralelo à operação pode não conter todos os cenários desejados na solução, aumentando o risco de problemas pós GO LIVE.

Descrição das atividades:

- Usuários-Chave (Cliente) organizam os processos e diferentes cenários para cobrir todas as variações de negócio inseridas no contexto da solução
- **NOTA:** a equipe de projeto TOTVS deve apoiar esta atividade orientando o preenchimento do roteiro de testes, mas a responsabilidade é do Cliente em elaborá-lo
- Analista / Especialista, Gerente ou Coordenador do Projeto organizam, em cima dos cenários propostos, os critérios e limites estabelecidos de como realizarão o teste integrado do sistema
- **NOTA:** O Teste Integrado do Sistema é o ciclo que garante o bom funcionamento do sistema e normalmente tem um teor mais técnico, ou seja, o sistema é executado com todas as funcionalidades previstas. Os valores e resultados esperados são apurados na validação de entrega
- Gerente do Projeto (Cliente) valida com os usuários-chave o [Roteiro de Testes - MIT045](#) e o publica oficialmente como base dos testes a serem realizados.



• Entrada | Desenvolvimento | Saída



ENTRADA(S):

- Diagrama dos Processos - MIT041



ATORES:

TOTVS

- Analista / Especialista de Implantação*
- Gerente ou Coordenador do Projeto*

CLIENTE

- Coordenador ou Comitê do Projeto*
- Usuários-Chave*
- Gestores funcionais de áreas de negócio



SAÍDA(S):

- Elaboração do Roteiro de Testes - MIT045 iniciada.

NOTA: É uma boa prática iniciar a definição dos roteiros de testes neste momento e fase, porém essa atividade deverá ser finalizada antes da execução dos testes, na fase realização.

*Obrigatório



Validação de Processos (Check-point / Aceite)



3.4.2 Realizar Testes Integrados do sistema - Time TOTVS ▾ [Acessar Detalhes](#)

O objetivo principal desta tarefa é garantir, além do funcionamento do sistema, que os resultados esperados sejam validados, assim como os processos e seus diferentes cenários. Em alguns casos, é incluído após os testes integrados, o teste de carga do sistema.

Descrição das atividades:

- Analista(s) / Consultor(es) se organizam de acordo com o planejado para executar a validação geral da solução.
- **NOTA 1:** nesta etapa, com o sistema em pleno funcionamento, deve-se validar os processos, seus diferentes cenários e apurar os resultados esperados.
- Analista(s) / Consultor(es) reportam o avanço, riscos / issues encontrados, eventuais atrasos e desvios ocorridos.
- Gerente ou Coordenador do Projeto acompanha evolução e trabalha na comunicação e alinhamento com o Comitê do Projeto / Cliente.

NOTA 2: o Gerente ou Coordenador do Projeto pode identificar a necessidade de fazer um teste de carga no sistema, devendo ser realizado nesta etapa, usando um documento de [Termo de Validação - MIT010](#) com o resultado dos testes.



• Entrada | Desenvolvimento | Saída



ENTRADA(S):

- [Roteiro de Testes - MIT045](#)



ATORES:

TOTVS

- Analista / Consultor de Implantação*
- Gerente ou Coordenador do Projeto*
- Suporte TOTVS

CLIENTE

- Coordenador ou Comitê do Projeto*



SAÍDA(S):

- Solução testada em toda sua funcionalidade, processos e cenários, considerando inclusive os resultados de negócio (que dependem de aspectos de cadastros e regras de negócio) e [Roteiro de Testes - MIT045](#), atualizado.
- Se aplicável, o [Termo de Validação - MIT010](#) com o resultado dos testes de carga.

*Obrigatório



MIT031

Solicitação de Mudança (Change Request - CR)



3.1.1 Configurar Produto ▾ Acessar Detalhes

É nesta etapa que a configuração do produto ocorre como o combinado e aprovado pelo cliente, respeitando o que foi definido na fase de refinamento e priorizado para cada *sprint*.

Caso surjam questões não previstas ou tratadas na fase anterior, estas serão discutidas pelo time nas reuniões de retrospectivas da *Sprint* e dependendo da questão deve-se obrigatoriamente registrar uma Solicitação de Mudança para que seja avaliado o impacto e se tenha uma aprovação formal desta, que pode alterar prazo, custo ou qualidade definida durante o Refinamento da Solução.

As entregas ocorrem através de *Sprints* (iterações) com tempo definido (idealmente de 2 a 4 semanas) e cada *Sprint* deve entregar um incremento do produto que pode ou não ser validado com o cliente, de acordo com o planejamento das releases (grupos de *Sprints*).

É esperado que as seguintes cerimônias aconteçam a cada ciclo de *Sprint*:

- Planejamento da *Sprint*: Cerimônia para definição do objetivo da *sprint*, escopo de trabalho, como e o que será entregue.
- Reunião da Iteração: ("Daily"): É a reunião de acompanhamento da *sprint*, onde é verificado o andamento da *Sprint*. De curta duração (não mais que 30 min), na qual cada membro reflete sobre: O que fez de ontem para hoje? O que farei de hoje até amanhã? Existe algum impedimento?

A recorrência da reunião pode ser definida de acordo com o contexto de cada projeto e pode ser realizada com todo o time do projeto com ou sem a participação do Coordenador ou Gerente do Projeto.

- Revisão da *Sprint*: é a cerimônia de apresentação do que ficou pronto para validação e coleta de feedback.
- Retrospectiva da *Sprint*: é a última atividade da *sprint*, na qual a equipe avalia sua própria atuação durante o processo de trabalho e planeja ações de melhoria a serem implementadas na próxima *sprint*.

Questões como: O que deu certo? O que pode melhorar? pendências e aprendizado (lições aprendidas) devem ser abordadas e registradas na planilha de Monitoramento e Controle do Projeto.

NOTA: Recomenda-se organizar várias [Solicitações de Mudança - MIT031](#) em conjunto para se ter uma melhor percepção dos impactos, ao invés de avaliá-las individualmente. Para tanto, pode-se estipular momentos / datas programadas para solicitar, avaliar e aprovar a demanda.

Descrição das atividades:

- Durante a *Sprint* o Analista ou Consultor de Implantação:
 - Configura o sistema com base no Diagrama dos processos aprovado pelo Cliente e backlog priorizado para a *Sprint*.
 - Reporta o avanço, riscos ou issues encontrados, eventuais atrasos e desvios ocorridos através das reuniões da iteração, ou das reuniões diárias.
- O Gerente ou Coordenador do Projeto acompanha evolução e trabalha na comunicação e alinhamento com o Comitê do Projeto ou Cliente.
- Ao final de cada *Sprint* é esperado que ocorra a reunião de retrospectiva, com todo o time que participou da *Sprint*.
- Após o encerramento de cada *Sprint*, inicia-se um novo ciclo de iteração até que todo o *backlog* do produto seja entregue.



Solicitação de Mudança | Lista de Retrospectiva e Pendências



ENTRADA(S):

- Diagrama dos processos - MIT041
- Plano de Configuração - MIT043
- Solicitação de Mudança - MIT031
- Backlog do Produto - MIT022/ Plano de Sprints e Release



ATORES:

TOTVS

- Analista / Consultor de Implantação*
- Gerente ou Coordenador do Projeto*

CLIENTE

- Coordenador ou Comitê do Projeto*



SAÍDA(S):

- Execução de todas as *sprints* planejadas no projeto, com o sistema configurado de acordo com os Diagramas dos Processos - MIT041, respeitando o Plano de Configuração - MIT043 e Solicitações de Mudança - MIT031 aprovadas pelo Cliente
- Reunião de Retrospectiva ao final de cada *Sprint*, registrada na Lista de Retrospectiva e Pendências - MIT006
- Plano de Configuração - MIT043 atualizado.

*Obrigatório



Solicitação de Mudança | Análise de Aderência e GAP's



2.1.3 Análise de Aderência e GAP's [Acessar Detalhes](#)

É essencial que esta análise de *gaps* seja realizada com o Cliente para identificar as reais necessidades antes de qualquer abordagem de negociação, para garantir valor agregado em qualquer análise de impactos e nos resultados no futuro.

É igualmente importante que haja uma análise interna do panorama entre o Gerente ou Coordenador do Projeto e o Arquiteto para definir uma estratégia de abordagem onde deverão indicar uma solução viável para a continuidade do projeto (e gerar um sentimento de parceria com o Cliente).

No fim das negociações e após a aprovação, é fundamental que o Gerente ou Coordenador do Projeto realize a atualização dos planos do projeto colocando os impactos levantados para aprovação do novo baseline versão 2.

Descrição das atividades:

- Analista / Especialista e Usuários-Chave relacionam os *gaps* identificados no [Diagrama dos Processos - MIT041](#) e listam na planilha de [Monitoramento e Controle do Projeto - MIT013](#) para organizar o contexto geral
- Analista / Especialista, Gerente ou Coordenador do Projeto e Arquiteto analisam o panorama geral, identificam e definem uma estratégia de abordagem para viabilizar o projeto
- **NOTA:** A recomendação é realizar esta análise olhando o panorama geral ao invés de avaliar os *gaps* e mudanças individualmente, pois normalmente existe uma compensação entre itens novos e itens cancelados, balanceando a negociação.
- Gerente ou Coordenador do Projeto e Arquiteto classificam os *gaps* e submetem para estudo e aprovação do Comitê do Projeto
- Comitê do Projeto:
 - Avalia o panorama geral para negociação dos itens (*gaps* e mudanças) entre as partes
 - Aprova a versão final negociada
- Gerente ou Coordenador do Projeto registra o resultado e atualiza o histórico do Projeto com as mudanças e impactos absorvidos.



• Entrada | Desenvolvimento | Saída



ENTRADA(S):

- Proposta Comercial assinada
- [Diagrama dos processos - MIT041](#)
- Material de apoio para levantamento (questionário)
- [Solicitação de Mudança - MIT031](#)



ATORES:

TOTVS

- Analista / Especialista*
- Gerente ou Coordenador do Projeto*
- Arquiteto de Soluções*
- Executivo de Soluções de Negócio

CLIENTE

- Coordenador ou Comitê do Projeto*
- Usuários-Chave*



SAÍDA(S):


- Análise de Gap e Mudança alinhada com o Cliente, com a definição do Arquiteto e Gerente ou Coordenador do Projeto sobre a abordagem e aprovação das mudanças através da [Solicitação de Mudança - MIT031](#)
- **Aprovação de um novo *baseline*** sobre as mudanças impactadas pelos *gaps* e mudanças (aprovados)

* Obrigatório



Fluxo das MITs

Fluxo de Trabalho | Mermaid Live Editor

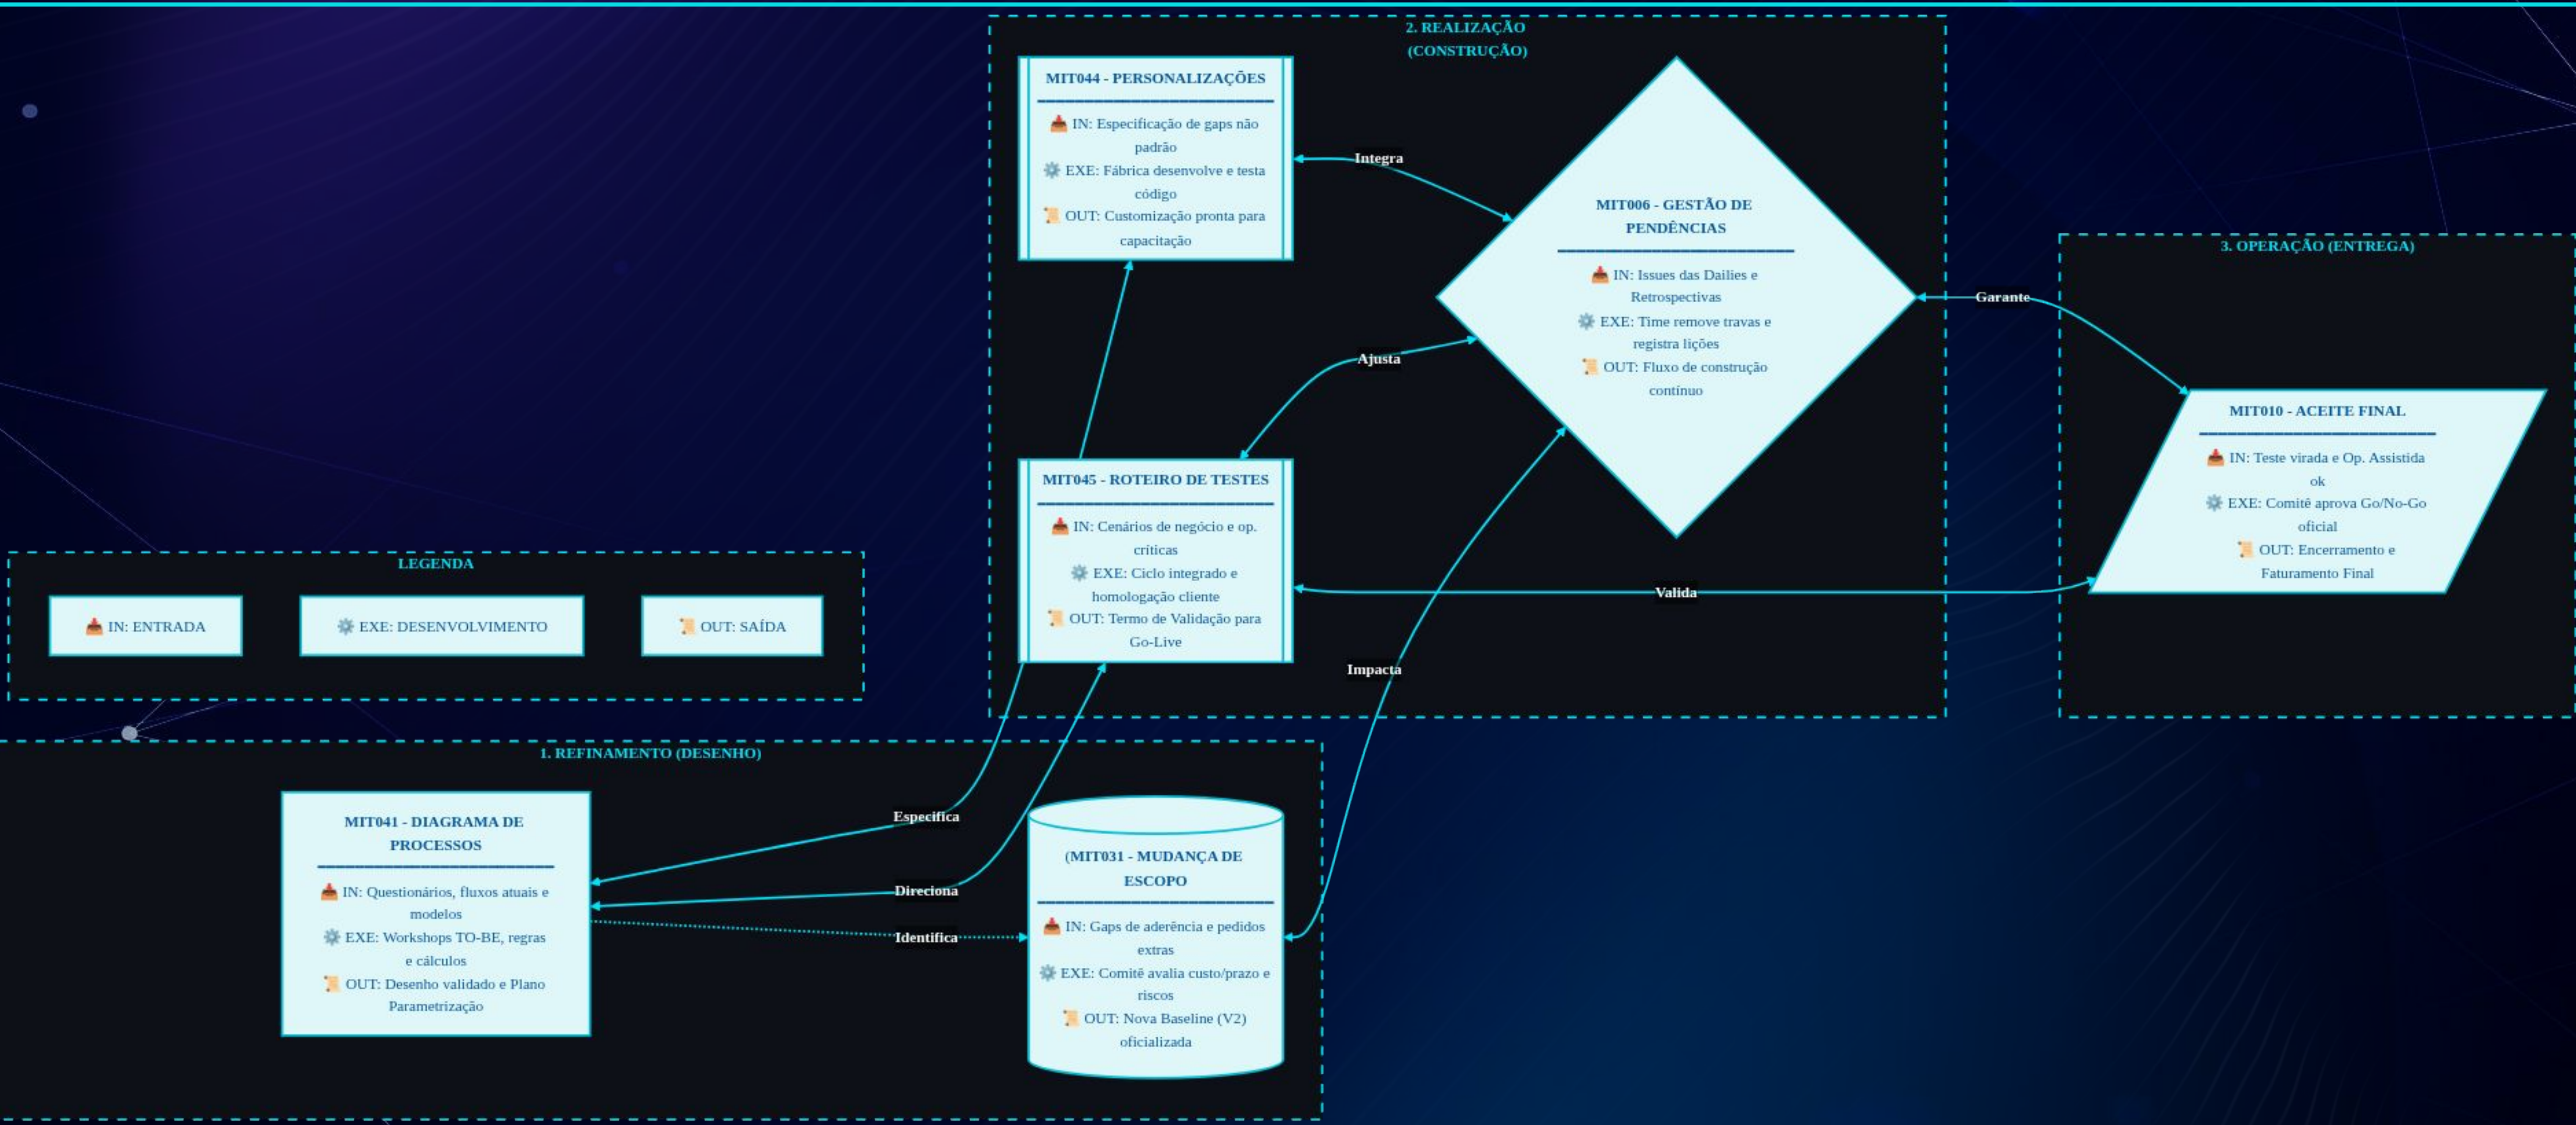



Referências MIT

TDN

[Diagrama dos processos - MIT041 | TDN](#)

[Especificação da Customização - MIT044 | TDN](#)

[Roteiro de Testes - Simplificado - MIT045 | TDN](#)

[Termo de Validação - MIT010 | TDN](#)

[Solicitação de Mudança - MIT031 | TDN](#)

[Lista de Retrospectiva e Pendências - MIT006 | TDN](#)

MIT041 | MIT044 | MIT045 | MIT010 | MIT031 | MIT006



Referências MIT



[Manifesto](#) | TDN

[Guia de Templates MIT Digital](#) | TDN

[MIT DIGITAL](#) | TDN

[De/Para - Templates](#) | TDN



Boas Práticas ADVPL



```
User Function MensagemQualidade()  
  Local cMensagem := ""  
  Local cTitulo := "Orientação Essencial"  
  
  // A seguinte linha é o cerne da nossa apresentação:  
  cMensagem += "Prezado cliente," + CRLF  
  cMensagem += CRLF  
  cMensagem += "Lembre-se sempre: 'Quantidade é diferente de qualidade'." + CRLF  
  cMensagem += CRLF  
  cMensagem += "Focamos em entregar o melhor resultado, não apenas o maior  
volume." + CRLF  
  cMensagem += CRLF  
  cMensagem += "Por favor, siga para o próximo slide para continuar o  
aprendizado."  
  // Exibe a mensagem de orientação  
  MsgInfo(cMensagem, cTitulo)  
  
Return
```





Referências - Boas Práticas ADVPL

T
O
T
V
S

D
E
V
E
L
O
P
E
R
/
T
D
N

[ADVPL - Boas práticas e dicas](#)

[SDK Protheus](#)

[Variáveis - Boas Práticas ADVPL](#)

[Comentários - Boas Práticas ADVPL](#)

[Boas práticas de filtro AdvPL com DBAccess](#)

[A Linguagem AdvPL](#)

[Convenções da ADVPL](#)



⚡ **Modo Overclock Ativado** ⚡



🚀 **Aceleradores + Inteligência Artificial** 🤖



Aceleradores | TOTVS Linha Protheus





e fortalecemos a nossa estratégia.

Obrigado

→ RAMON CINTAS GOMES

→ DESENVOLVEDOR TÉCNICO DE SERVIÇOS

→ ramon.gomes@totvs.com.br



totvs.com



[@totvs](https://www.instagram.com/totvs)



[@totvs](https://twitter.com/totvs)



[/totvs](https://www.twitch.tv/totvs)



[/totvs](https://www.youtube.com/totvs)



[company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)



totvs.store

O Brasil

que

faz

faz

com



TOTVS



TOTVS
